


### Časový plán etap:

- 0 - Stávající stav
  - 1 - 01.05.2024 - 31.05.2024 Přípravné práce na trakti a přeložkách, střídavě pracovní místo + UZ chodníku (levá nebo pravá strana).
  - 2 - 01.06.2024 - 07.11.2024 Zahájení prací, průjezd vozidel pravá a levá strana mostu.  
31.10.2024 Vkládání provizorií mostu.
  - 3 - 08.11.2024 - 31.08.2025 Převedení provozu na provizoria (střed).
  - 4 - 01.09.2025 - 31.10.2025 Převedení provozu, průjezd vozidel pravá a levá strana mostu.
  - 5 - 05.10.2025 - 09.10.2025 Demontáž provizorií - střed
  - 6 - 10.09.2025 - 31.10.2025 Dokončovací práce na středu mostu
  - 0 - Stávající stav
- Odsouhlasení termínu etap bude provedeno vždy na KD, v průběhu stavebních prací.

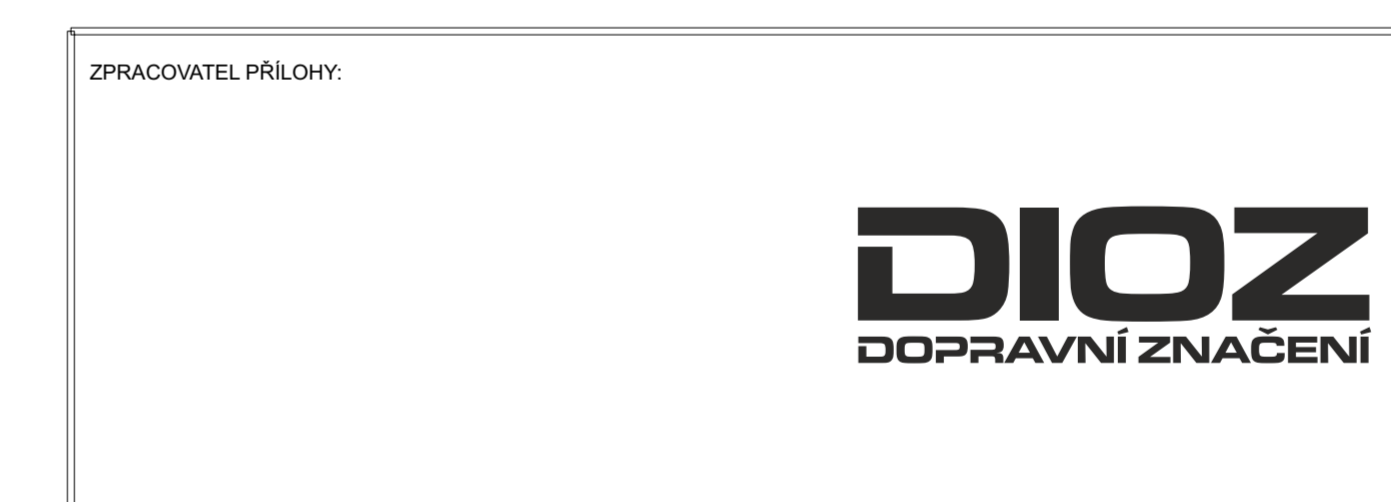

SO 180  
DSP+VD-ZDS

SOÚRADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV

KRESLIL:	KOLEKTIV	
ZPRACOVAL:	JAROSLAV MICHEK	
TECHNICKÁ KONTROLA:	ING. JAN BURSA	
ZODP. PROJEKTANT SO:		
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:	ING. JAN BURSA	
KRAJ: PARDUBICKÝ	OKRES: PARDUBICE	OBEC: PARDUBICE



FÖRSTEROVA Č.P. 175, 566 01 VYSOKÉ MÝTO  
EMAIL: MDS@MDSPROJEKT.CZ

INVESTOR: ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR, SPRÁVA PARDUBICE

AKCE: OPRAVA MOSTU PAVLA WONKY,  
EV.Č. 324-018, PARDUBICE

ČÁST: SO 180 - DIO BĚHEM VÝSTAVBY

OBSAH:

STUPEŇ:	DSP+VD-ZDS
ZAK.ČÍSLO:	1749-18-3
ARCHIVNÍ ČÍSLO:	1749
DATUM:	1/2024
FORMÁT:	3x A4
MĚŘÍTKO:	
ČÍSLO SOUPRAVY:	ČÍSLO PŘÍLOHY: 3.
