

IV-12-2025158 Pardubice Kréta Riegrova, Kavanova knn (výkopové práce + demontáž vrch. vedení)

Vypracoval: **Jakub Schindler - 724 330 693**


- stavba nebude probíhat po jednotlivých úsecích cca 50 m (posuvné prac. místo)
- překopy vozovky v ul. Kavanova budou realizována po 1/2 vozovky
- úplná uzavírka v ul. Riegrova max. 14 dní
- obyvatelům bude umožněn přístup k nemovitostem (pochozí lávky)
- vškeré výkopy budou řádně označeny a zabezpečeny
- přechodné DZ bude stanoveno s ohledem na bezpečnost a plynulost provozu

Termín realizace: 29. 6. - 21. 8. 2026 (včetně demontáže a fin. úprav)


— překop vozovky
— trasa výkopu
— překop vozovky po 1/2
— pojezdová deska / plech

Mimo vozidel stavby od do

Všechny B28 doplněny o tuto dodatkovou tabulku

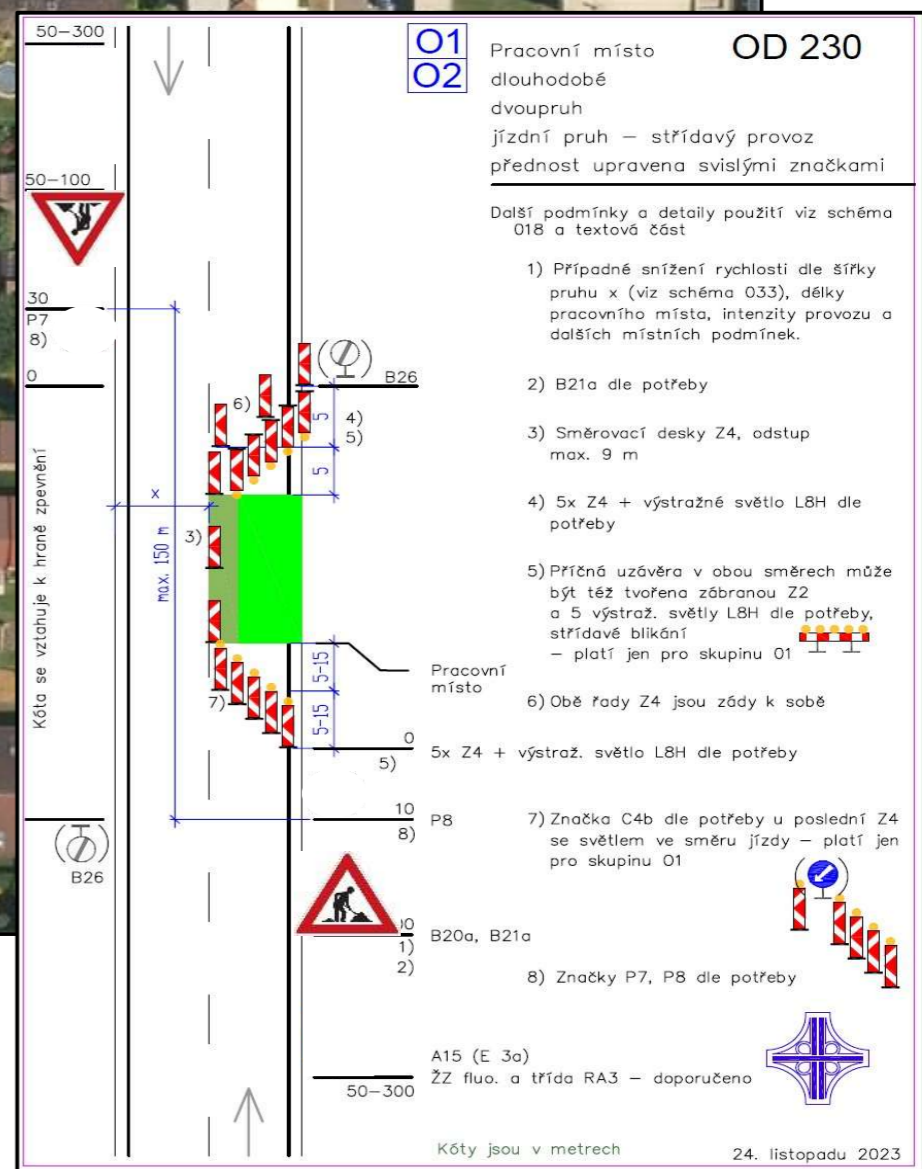

CHODNÍK ZA 50 M UZAVŘEN



CHODNÍK ZA 50 M UZAVŘEN
