

— uzavřený úsek 180 m
— objízdná trasa 300 m

25GV-008 Pardubice, Popkovická kanalizace IV

termín: 3.11.2025 - 12.4.2026

Bude provedeno přepojení 8 kusů domovních přípojek z kameninového potrubí DN 150 mm tř. 160 v celkové délce 32,0 m.

Ve dně stávajících šachet bude vyfrézován otvor pro kameninové potrubí DN 600 mm. Prostor mezi novým potrubím a stávajícím vejcem DN 700/1050 bude dobetonován. Na odtoku obou stok bude proveden spádový beton s osazením kompozitních profilů pro osazení hradítek. Tyto práce budou prováděny v součinnosti s VAK Pardubice. U šachty bude opraveno dno stěrkou z vysoko-pevnostní kanalizační malty, zrnitosti do 4 mm, zatížitelnou vodou cca po 4 hodinách.

B 1

MIMO VOZIDLA STAVBY

E 13

Z 2

B 24a

MIMO VOZIDLA STAVBY

E 13

B 24b

MIMO VOZIDLA STAVBY

E 13

B 28


DATUM

E 13

E 8a

IS 11c

Vymístění vozidel - osazení DZ 7 dní, před plánovanými pracemi.

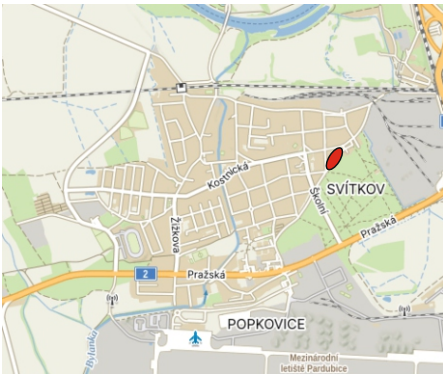

Zhotovitel:				
Kreslil:	Blanka Faltysová / tel.: 601 545 613			
Zodp. projektant:				
Kontroloval:	David Fanta / 603 115 936 / info@dzpce.cz			
Kraj: Pardubický	Okres: Pardubice	Obec: Svítkov	DZPCE DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PARDUBICE s.r.o. Rosice 155 533 51 Pardubice IČO: 259 31 016 DIČ: CZ25931016 tel.: 603 115 936 e-mail: info@dzpce.cz web: www.dzpce.cz	
Akce:	kanalizace IV		DATUM 06.10.2025	
			Č.ZAKÁZKY	
			STUPEŇ PD DIO	
DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ			MĚŘÍTKO	
			FORMÁT A3	
