


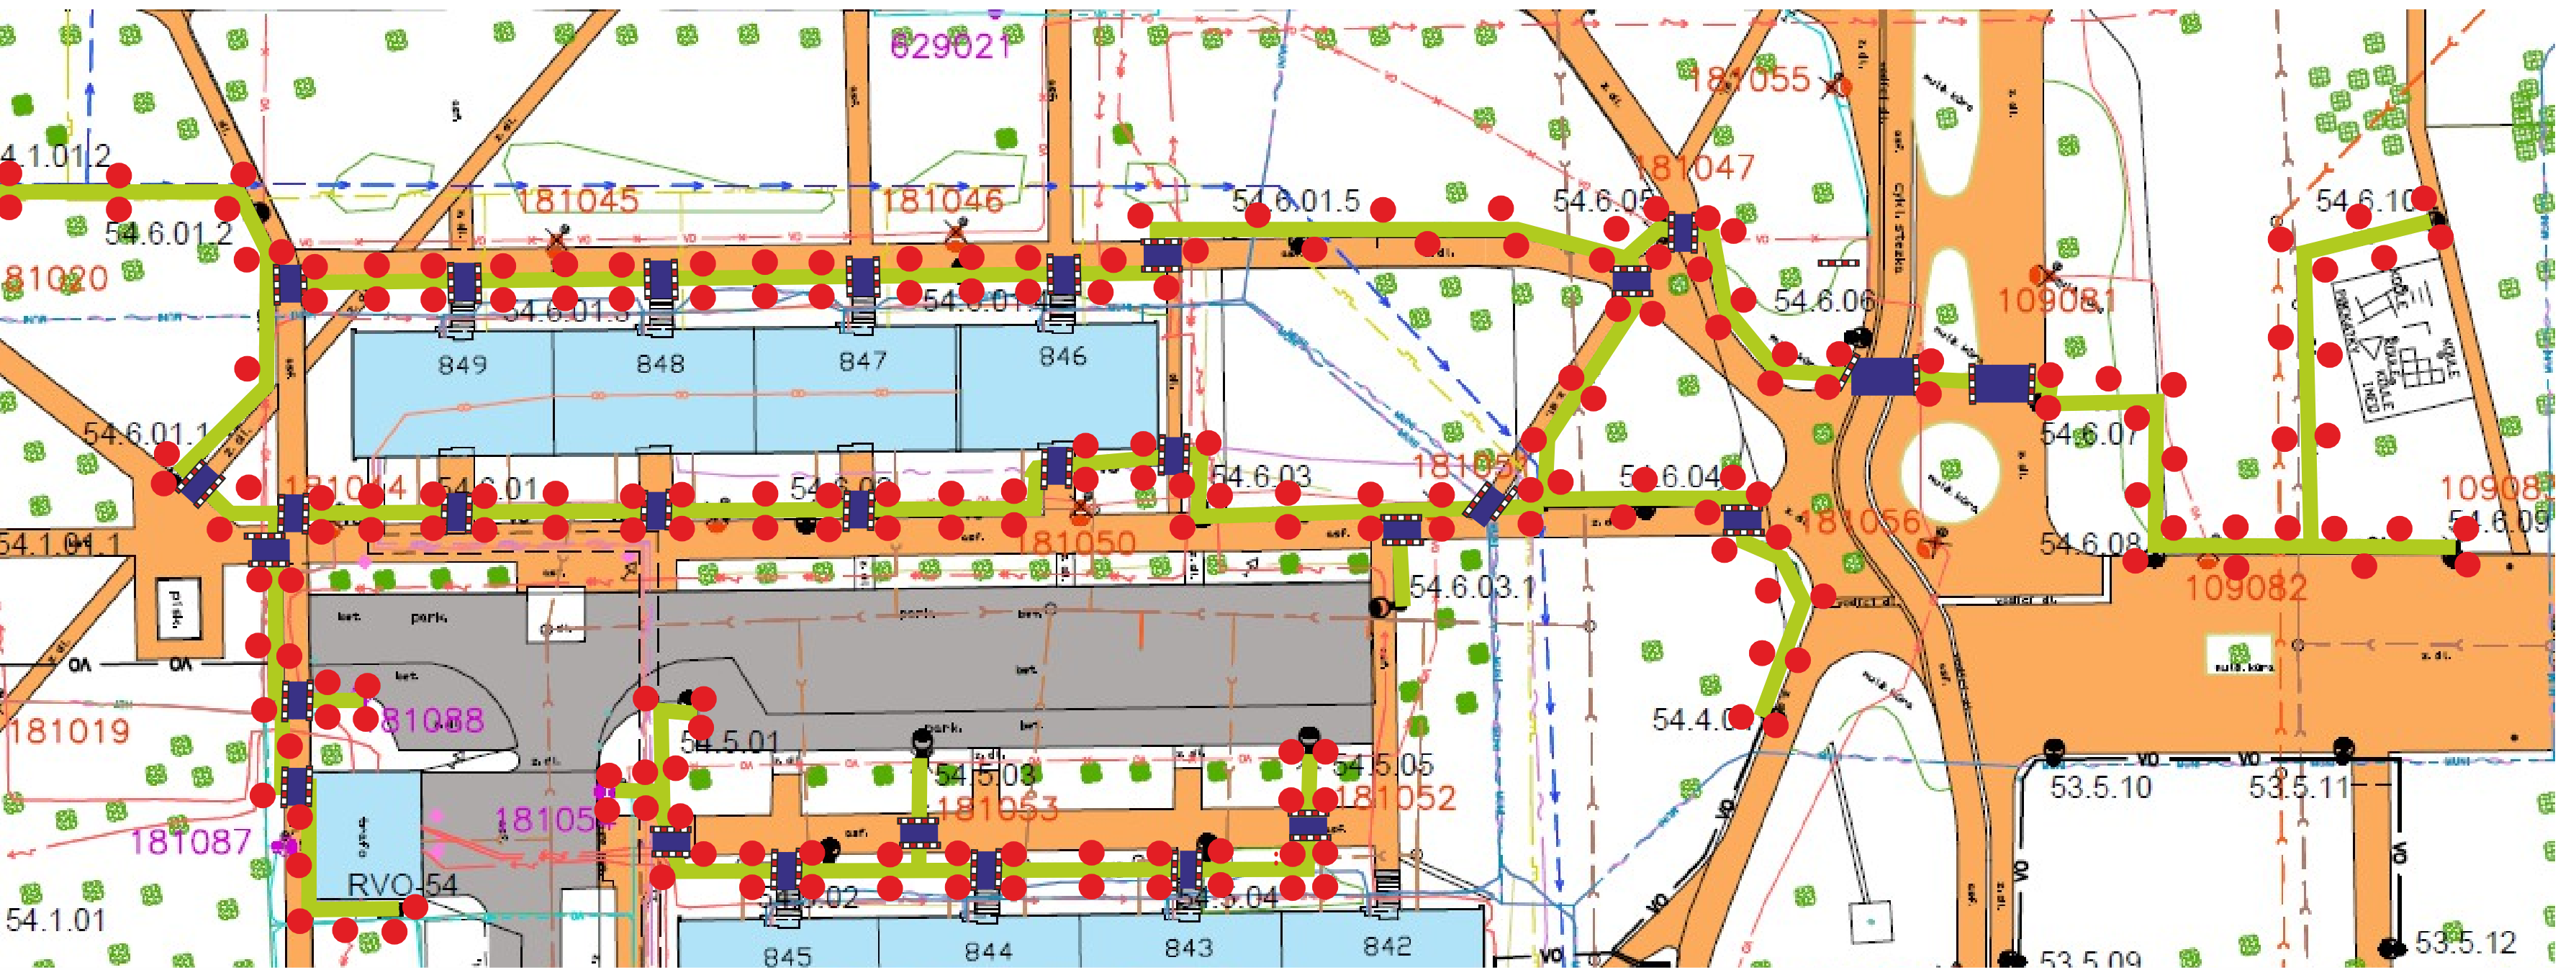

Výkopové práce budou prováděny převážně v travnatém pásu mezi chodníkem a vozovkou, nebo u chodníků.
V místě překopů chodníků budou umístěny přechodové lávky.
Výkop ze strany chodníku bude zabezpečen zábranou Z2, popřípadě Z4 a výstražnou vtyčovací páskou.
Pohyb chodců po chodnících nebude nijak omezen.
Na vyobrazených zájmových chodnících bude ponechán průchozí prostor minimálně 1,5 m široký.

Pracovní místo na krajnici bude označeno dle schématu číslo OD 211- Příručky pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích.
V případě požití DZ B28 v různých konfiguracích budou tyto osazeny minimálně 7 dní předem.

Trasa VO

Z2

Přechodová lávka

Z4

Formát:	1 x A4	Datum:	20.05.2026	 SLUŽBY MĚSTA PARDUBICE a.s. Služby města Pardubic a. s. Hlávka 1803 530 12 Pardubice- Bílé předměstí IČ 25 26 25 72 mobíl: 777 783 111
Číslo zakázky:	1103/2026			
Vypracoval:	Ladislav Paulus	Kontroloval:	Ing. Luděk Čapek	
Akce:	Zemní práce - veřejné osvětlení Pardubice, Dubina			
Objednatel:	Služby města Pardubice a.s.			
Část:	Etapa 6			

O1
O2

Pracovní místo

OD 211

dlouhodobě

dvoupruh

krajnice




bez zúžení jízdního pruhu

Třípruh a směrově nerozdělený čtyřpruh
obdobně

- 1) Případné snížení rychlosti dle délky
pracovního místa, intenzity provozu a
dalších místních podmínek. Snížování
rychlosti po 100 m.

U podélné uzavěry delší než 500 m se
opakuje každých max. 500 m.

Pokud pracoviště při přerušení prací
(mimo pracovní dobu) nepředstavuje
vysoké nebezpečí, značky B20a se
zruší nebo se rychlost zvýší

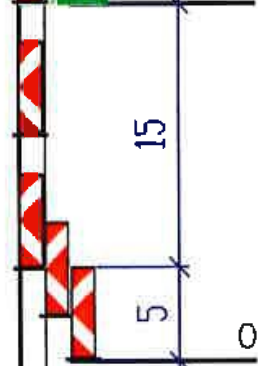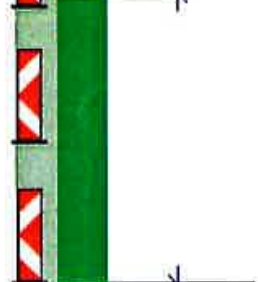

Pracovní místo

Směrovací desky Z4
odstup max. 9 m

3x Z4



50 B20a
1)



50-100

A15

ŽZ fluo. a třída RA3 – doporučeno



Kóty jsou v metrech

24. listopadu 2023

